1 PREMESSE

Il presente elaborato descrive con particolarità tutte le variazioni del traffico che la scrivente impresa propone al fine di eseguire le opere di cui ai lavori di "COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE E ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE.

CUP: E52E22000000001 CIG: B1EC1B36AC ". Tale piano traffico è consegnato, prima dell'inizio dei lavori, all'ente gestore delle strade al fine di emissione delle relative autorizzazioni e ordinanze di variazione al traffico.

Il layout è rappresentato da semplici indicazioni e mappa individuanti i percorsi alternativi e le chiusure totali e/o parziali che saranno disposte in fase esecutiva.

2 AREE DI INTERVENTO

Di seguito la planimetria con indicazione delle strade di intervento:

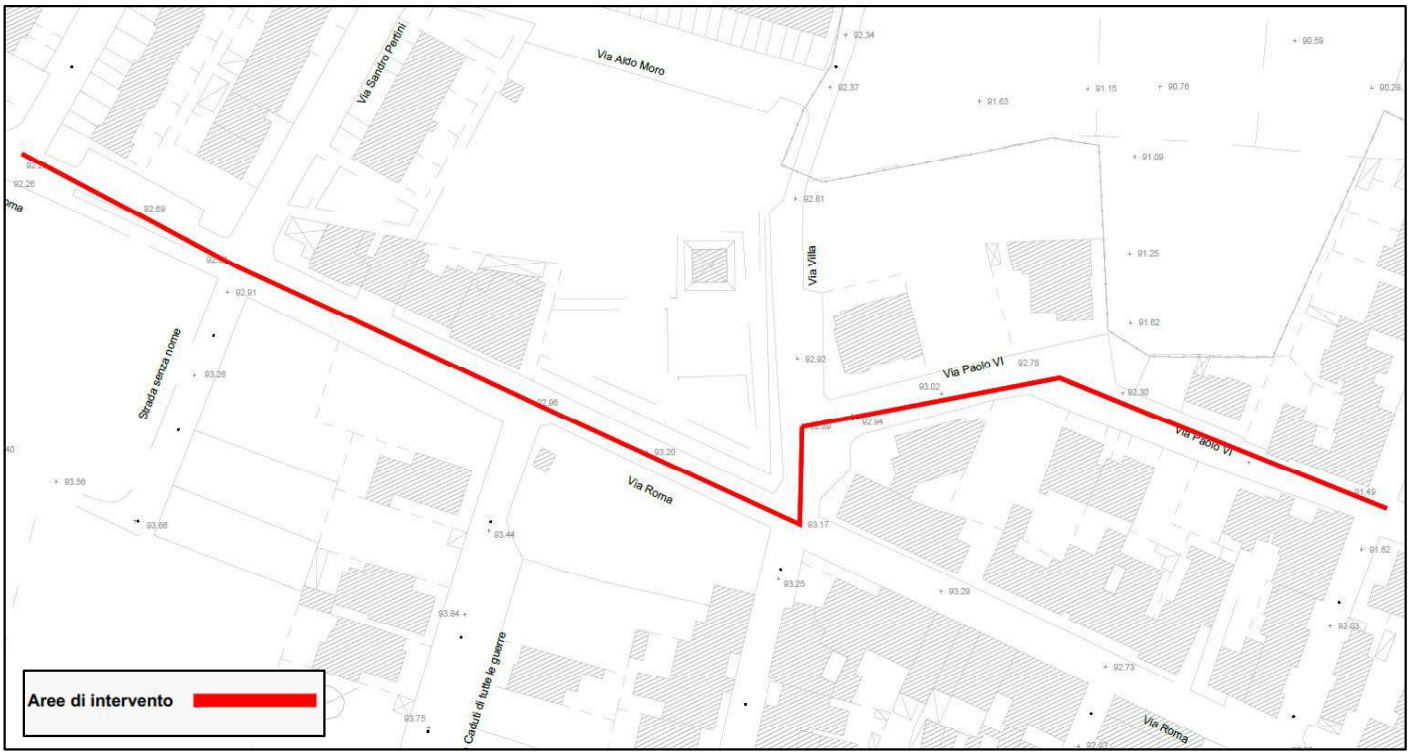

Comune di Martignano - Prot. n. 0001702 del 03/04/2025 - ARRIVO

3 PIANO TRAFFICO

N. fase programmatica	FASE 1
Strada in esame	VIA ROMA
Percorrenza attuale	Doppio senso di marcia
Percorsi alternativi	Percorso: Via Roma → Via A. Segni→ Via E. Berlinguer → Via S. Pertini→ Via Roma
Tipologia di variazione necessaria	Chiusura totale al traffico veicolare (zona rossa) con divieto di sosta e fermata
Viabilità residenti	Sarà garantito l'accesso pedonale ai residenti e il passaggio di veicoli di soccorso e pronto intervento
Schema tipologico segnaletica	Tavola in allegato (Tavola 2)

Comune di Martignano - Prot. n. 0001702 del 03/04/2025 - ARRIVO

N. fase programmatica	FASE 2
Strada in esame	VIA ROMA
Percorrenza attuale	Doppio senso di marcia
Percorsi alternativi	Percorso: Via Roma → Via S. Pertini → Via E. Berlinguer →Via Villa → Via Roma
Tipologia di variazione necessaria	Chiusura totale al traffico veicolare (zona rossa) con divieto di sosta e fermata
Viabilità residenti	Sarà garantito l'accesso pedonale ai residenti e il passaggio di veicoli di soccorso e pronto intervento
Schema tipologico segnaletica	Tavola in allegato (Tavola 2)

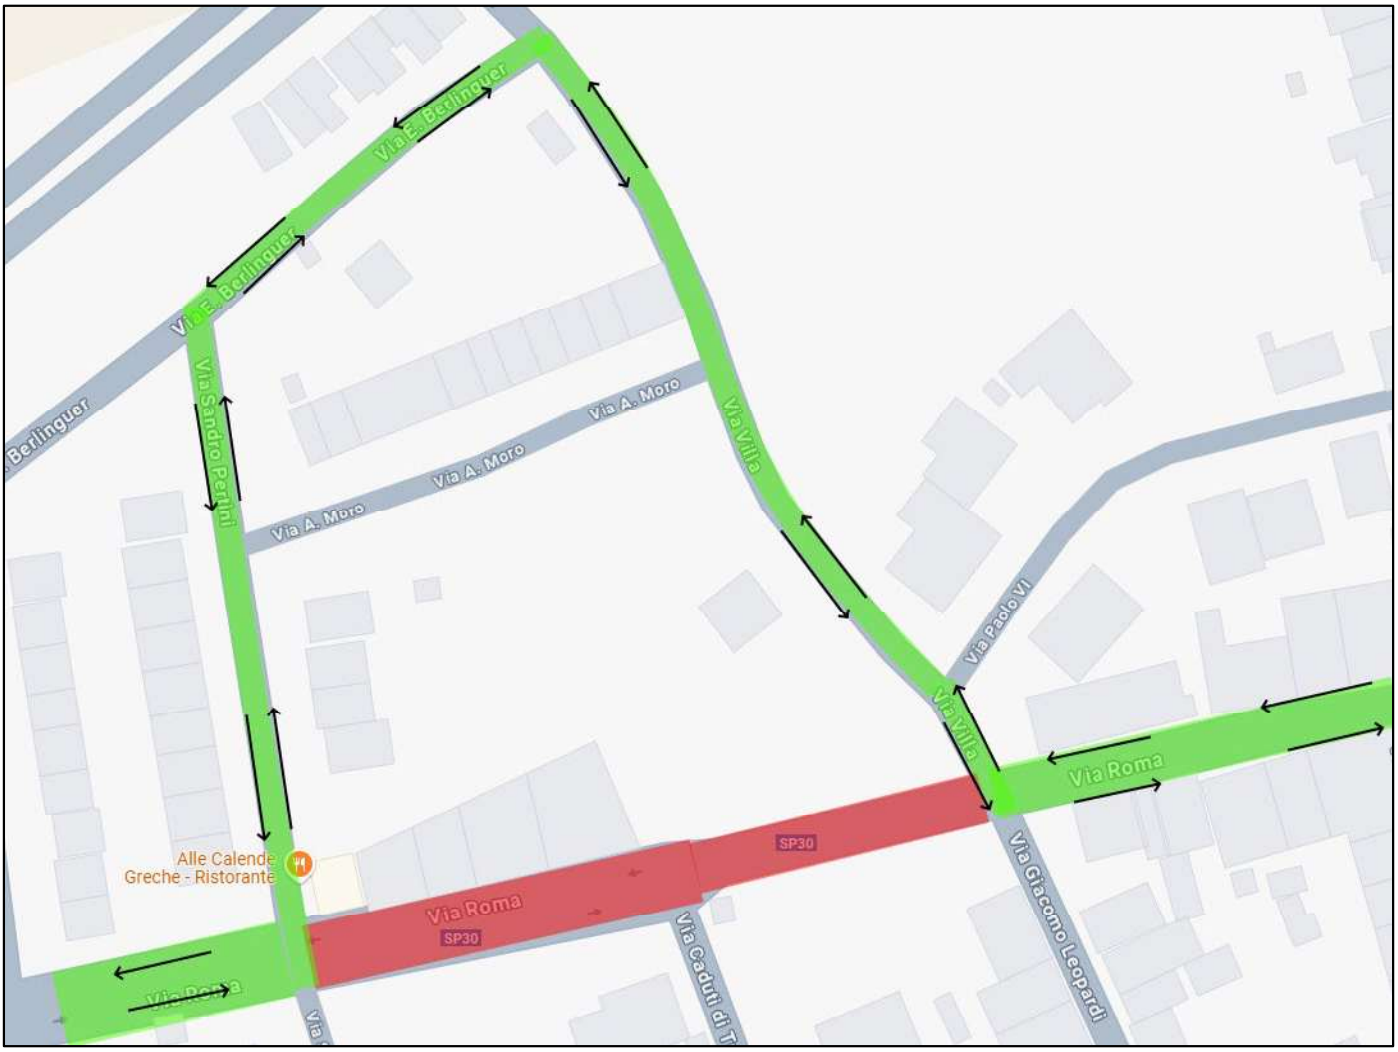

Comune di Martignano - Prot. n. 0001702 del 03/04/2025 - ARRIVO

N. fase programmatica	FASE UNICA
Strada in esame	VIA VILLA
Percorrenza attuale	Doppio senso di marcia
Tipologia di variazione necessaria	Chiusura totale al traffico veicolare (zona rossa) con divieto di sosta e fermata
Percorsi alternativi	Percorso 1: Via Roma→ Via A. Moro → Via Villa → Via Paolo VI → Via D. Alighieri → Via Roma Percorso 2: Via Roma → Via D. Alighieri → Via Paolo VI → Via Villa → Via A. Moro → Via Roma
Viabilità residenti	Sarà garantito l'accesso pedonale ai residenti e il passaggio di veicoli di soccorso e pronto intervento
Schema tipologico segnaletica	Tavola in allegato (Tavola 2)

Comune di Martignano - Prot. n. 0001702 del 03/04/2025 - ARRIVO

N. fase programmatica	FASE UNICA
Strada in esame	VIA PAOLO VI
Percorrenza attuale	Doppio senso di marcia
Tipologia di variazione necessaria	Chiusura totale al traffico veicolare (zona rossa) con divieto di sosta e fermata
Percorsi alternativi	Percorso: Via Roma → Via Villa → Via P. Neruda → Via Turati → Via De Gasperi → Via D. Alighieri → Via Roma
Viabilità residenti	Sarà garantito l'accesso pedonale ai residenti e il passaggio di veicoli di soccorso e pronto intervento
Schema tipologico segnaletica	Tavola in allegato (Tavola 2)

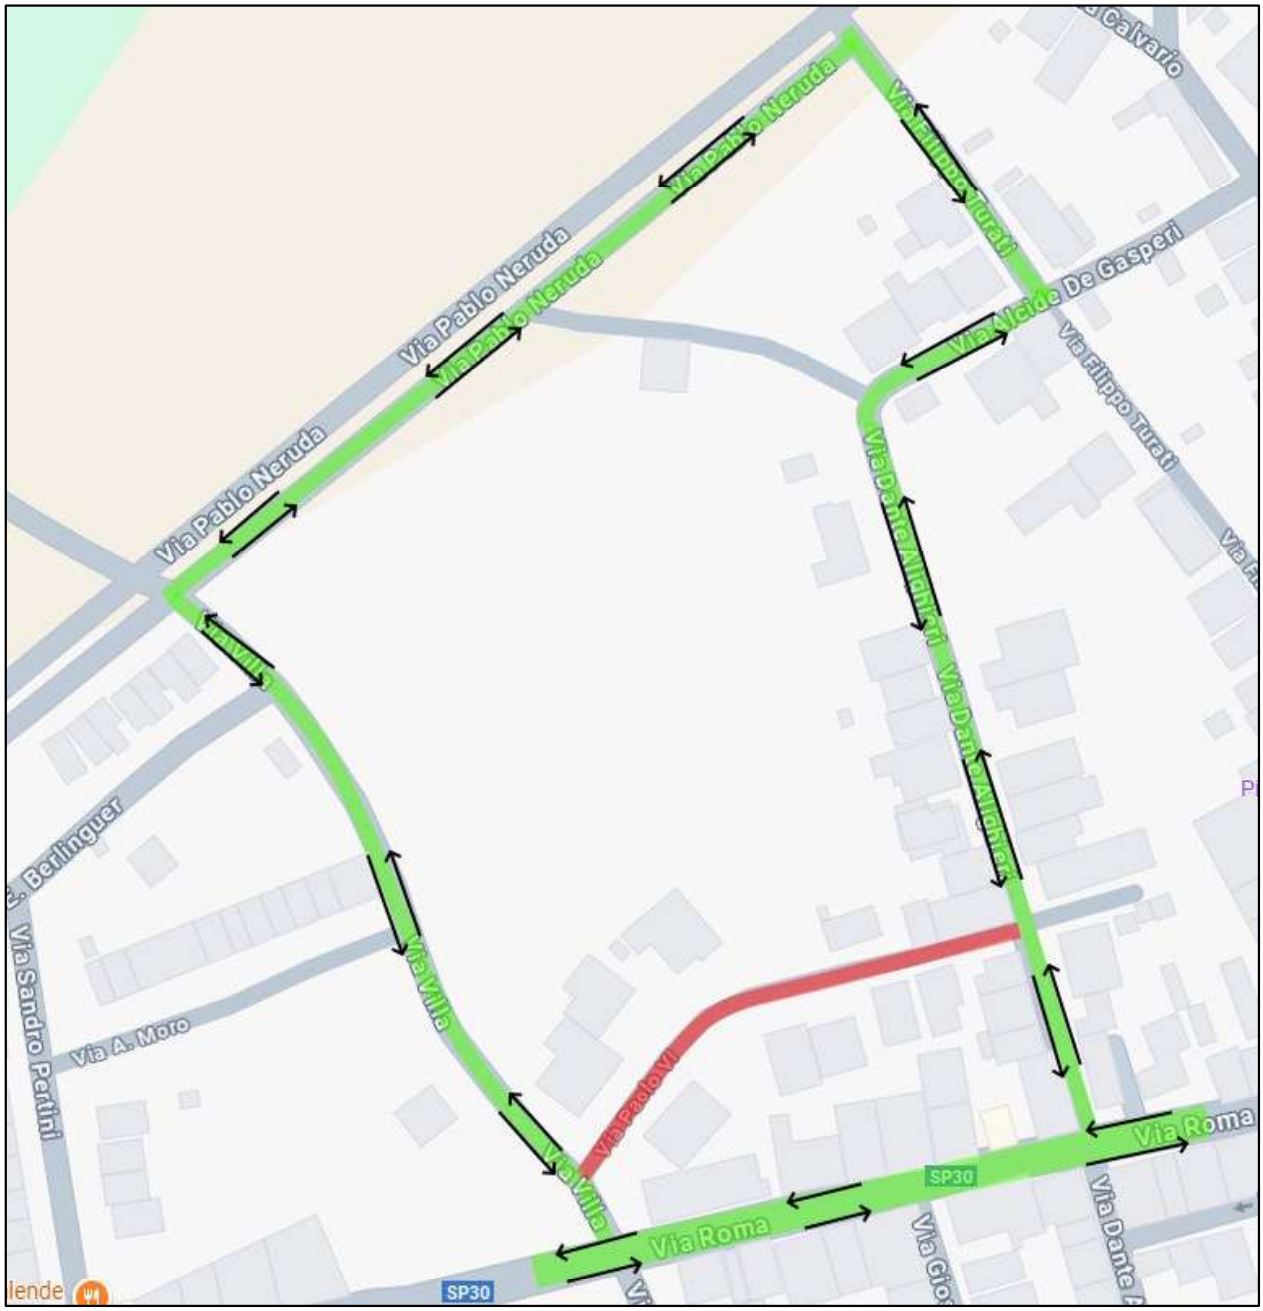

Comune di Martignano - Prot. n. 0001702 del 03/04/2025 - ARRIVO

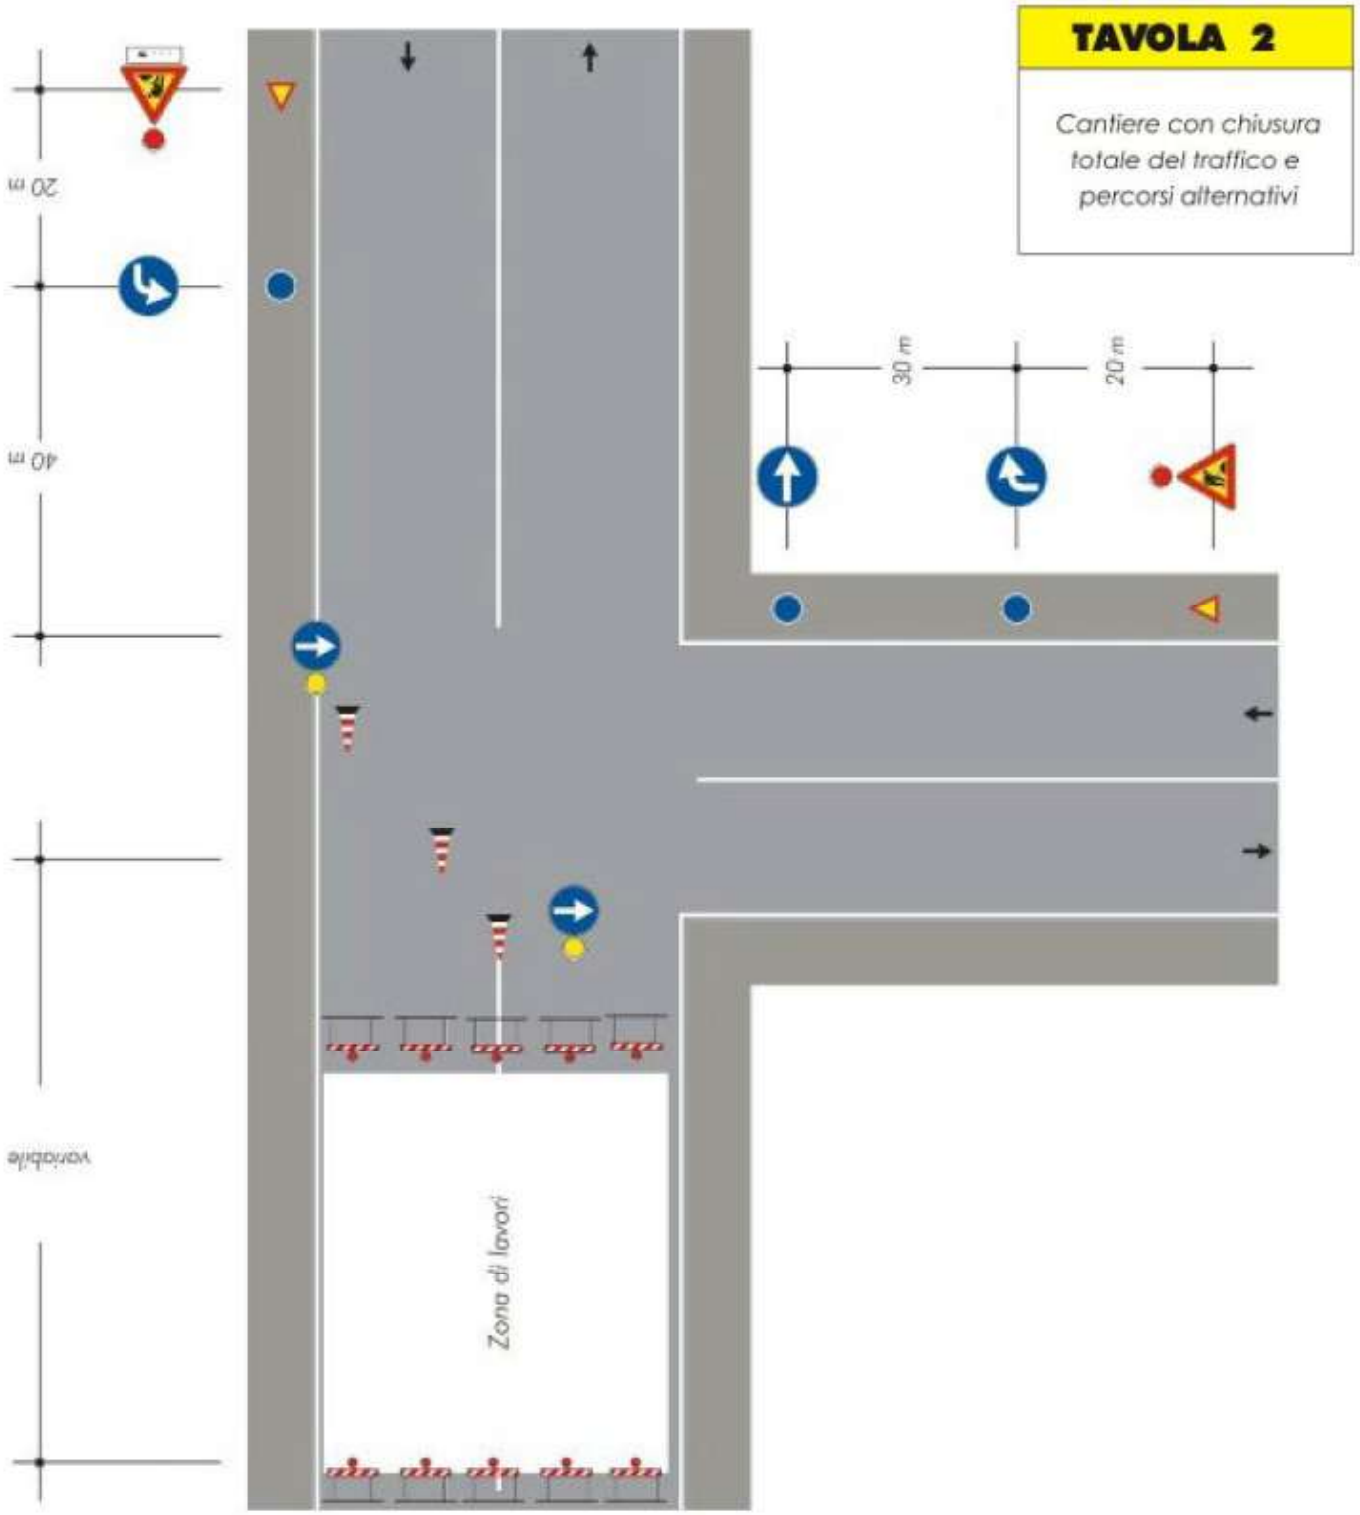

Comune di Martignano - Prot. n. 0001702 del 03/04/2025 - ARRIVO

4 INFORMAZIONI UTILI

4.1 PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

Giorni e orari di apertura cantiere: dal lunedì al venerdì dalle ore 06.30 alle 15.30.

Tali orari potranno essere variati in ragione di emergenze e/o necessità operative, ad es. si potranno posticipare di 2 ore e/o lavorare durante il sabato.

4.2 RECAPITI DI RIFERIMENTO:

Impresa appaltatrice: Franco s.r.l, Via Bortone 12, 73010 Caprarica di Lecce (LE) – Tel. 0832 825251

Responsabile Commessa: Ing. Paolo Siciliano – Tel: 329 8630450

Comune di Martignano - Prot. n. 0001702 del 03/04/2025 - ARRIVO
